

**Информация о финансировании мероприятий в 2012 году
в рамках ДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области» на 2012-2015 годы**

В 2012 году на финансирование программы было предусмотрено 1 685 897,4 тыс.рублей, при этом кассовый расход составил 1 505 127,3 тыс. руб. Степень освоения 89,3%.

Неосвоенная сумма составляет по региональным автодорогам 157 354,4 тыс.руб. (11,6% от средств, предусмотренных на региональные дороги) , по муниципальным – 23 416,6 тыс. руб. (7,2% от средств субсидий предусмотренных на муниципальные дороги).

Основные причины неполного освоения средств:

- в части региональных дорог:

61 218,8 тыс.руб. (38,9%) – неоплата невыполненных, в т.ч. некачественно выполненных работ по вине подрядчика;

42 863,1 тыс.руб. (27,2%) - экономия по итогам выполнения работ, которая включает в себя:

- неоплату предусмотренных сметой мероприятий (временные здания и сооружения, непредвиденные работы и затраты) в связи с невыставлением подрядчиком счетов на данные виды работ,

- уточнение стартовой цены по итогам выполнения проектных работ;

- невыполнение запланированных проектных работ по реконструкции автоподъезда к с.п. Териберка, км 20- км 40, в связи с изменением сроков начала освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.

26 241,6 тыс. руб. (16,7%) – неизрасходованные средства в связи с расторжением контракта с ООО «УК «МДУ» по содержанию региональных автодорог «ЮГ»;

23 563,4 тыс. руб. (15,0%) – неоплата за невыполненные работы подрядчикам в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий

2 114,7 тыс. руб. (1,3%) – экономия по итогам проведения торгов,

1 352,8 тыс. руб. (0,9%) – неоплата подрядчикам по причине наложения штрафных санкций

- в части муниципальных дорог:

5 688,9 тыс. руб. (24,3%) - неоплата за невыполненные работы подрядчикам в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий,


5 298 тыс. руб. (22,6%) – несостоявшиеся аукционы в связи с отсутствием заявок,

5 278 тыс. руб. (22,5%) - неоплата невыполненных, в т.ч. некачественно выполненных работ по вине подрядчика;


3 177,3 тыс.руб. (13,5%) - экономия по итогам проведения торгов,

3 974 тыс. руб. (16,9%) – предоставление недостоверной информации о наличии в собственности муниципальных образований объектов улично-дорожной сети и дворовых территорий.

Степень освоения финансовых средств, предусмотренных программой

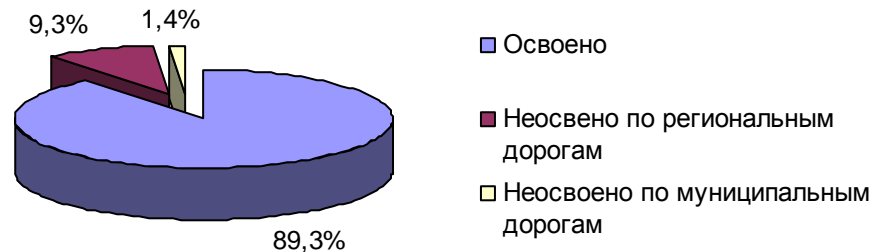

Причины неосвоения средств выделенных на региональные дороги

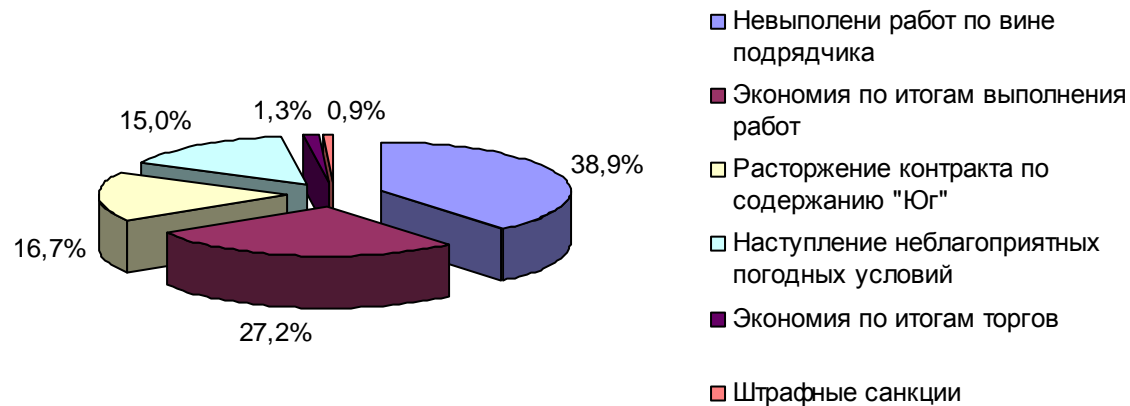

Причины неосвоения средств выделенных на муниципальные дороги

